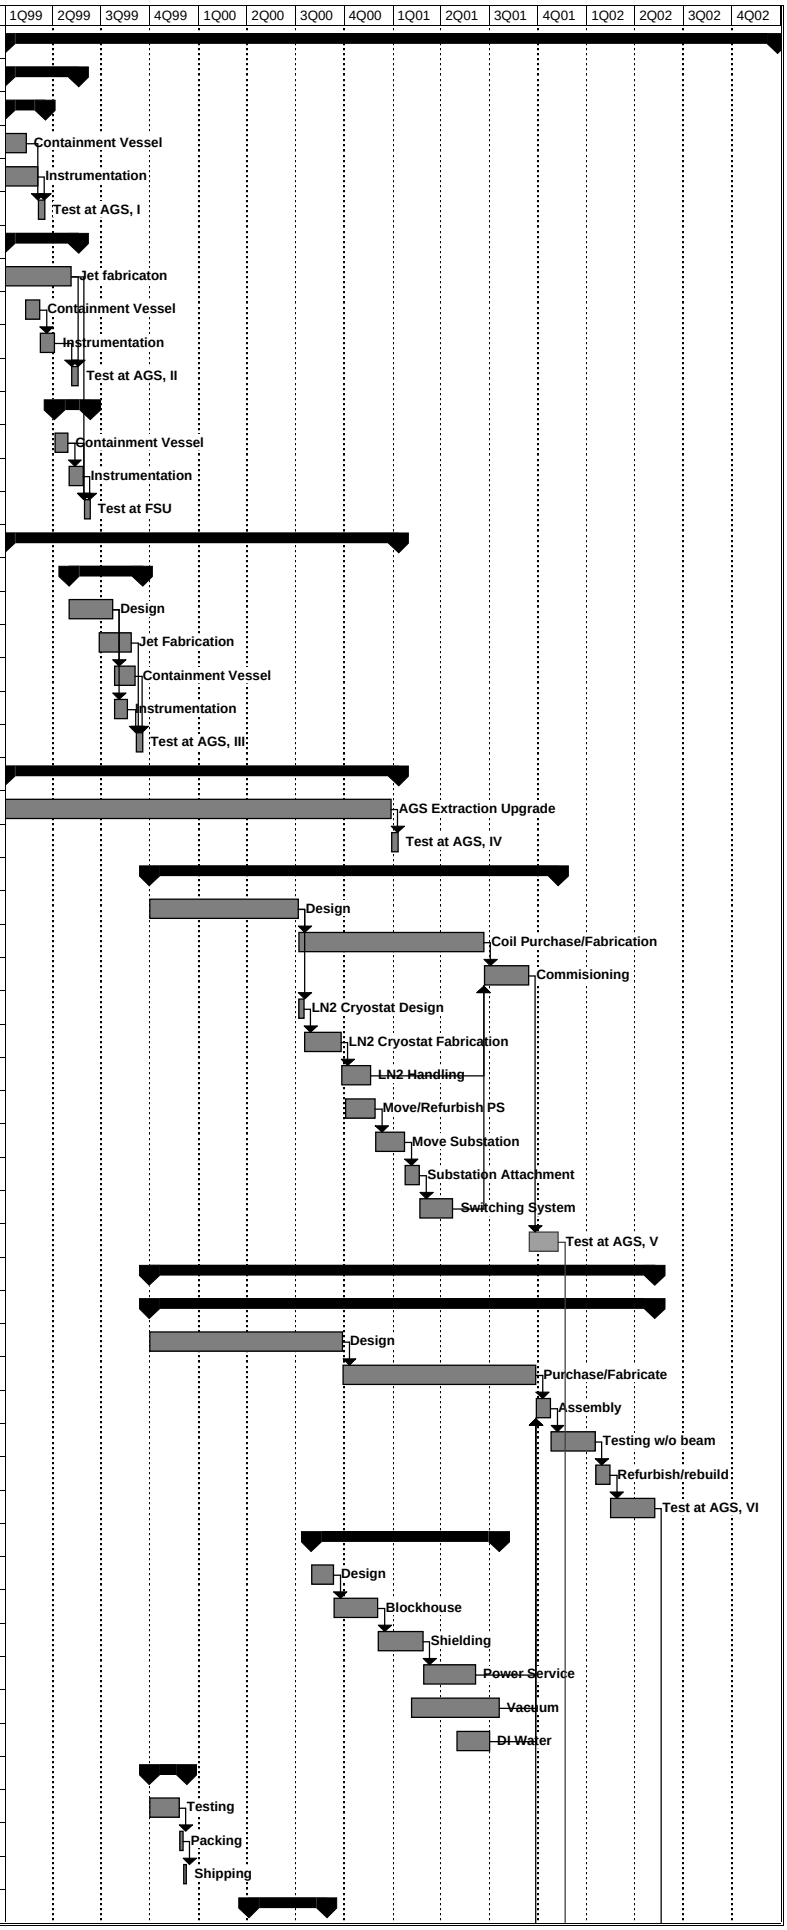ID	Task Name	Duration	Cost	Start	Finish
1	**Targetry R&D**	**1040 days**	**$7,110,000**	**Fri 1/1/99**	**Thu 12/26/02**
2	**Liquid Metal I**	**100 days**	**$130,000**	**Fri 1/1/99**	**Thu 5/20/99**
3	**Initial Beam Test**	**55 days**	**$80,000**	**Fri 1/1/99**	**Thu 3/18/99**
4	Containment Vessel	30 days	$30,000	Fri 1/1/99	Thu 2/11/99
5	Instrumentation	45 days	$40,000	Fri 1/1/99	Thu 3/4/99
6	Test at AGS, I	10 days	$10,000	Fri 3/5/99	Thu 3/18/99
7	**3 mm Jet Test**	**100 days**	**$50,000**	**Fri 1/1/99**	**Thu 5/20/99**
8	Jet fabricaton	90 days	$20,000	Fri 1/1/99	Thu 5/6/99
9	Containment Vessel	20 days	$10,000	Tue 2/9/99	Mon 3/8/99
10	Instrumentation	20 days	$10,000	Tue 3/9/99	Mon 4/5/99
11	Test at AGS, II	10 days	$10,000	Fri 5/7/99	Thu 5/20/99
12	**Jet Test at FSU Magnet**	**50 days**	**$60,000**	**Mon 4/5/99**	**Fri 6/11/99**
13	Containment Vessel	20 days	$20,000	Mon 4/5/99	Fri 4/30/99
14	Instrumentation	20 days	$20,000	Mon 5/3/99	Fri 5/28/99
15	Test at FSU	10 days	$20,000	Mon 5/31/99	Fri 6/11/99
16	**2 cm Jet, 1e14 p's**	**530 days**	**$600,000**	**Fri 1/1/99**	**Thu 1/11/01**
17	**2 cm Jet**	**100 days**	**$90,000**	**Mon 5/3/99**	**Fri 9/17/99**
18	Design	60 days	$20,000	Mon 5/3/99	Fri 7/23/99
19	Jet Fabrication	45 days	$20,000	Mon 6/28/99	Fri 8/27/99
20	Containment Vessel	30 days	$20,000	Mon 7/26/99	Fri 9/3/99
21	Instrumentation	20 days	$20,000	Mon 7/26/99	Fri 8/20/99
22	Test at AGS, III	10 days	$10,000	Mon 9/6/99	Fri 9/17/99
23	**1e14 ppp**	**530 days**	**$510,000**	**Fri 1/1/99**	**Thu 1/11/01**
24	AGS Extraction Upgr	520 days	$500,000	Fri 1/1/99	Thu 12/28/00
25	Test at AGS, IV	10 days	$10,000	Fri 12/29/00	Thu 1/11/01
26	**Pulsed Solenoid**	**550 days**	**$1,020,000**	**Fri 10/1/99**	**Thu 11/8/01**
27	Design	200 days	$100,000	Fri 10/1/99	Thu 7/6/00
28	Coil Purchase/Fabrication	250 days	$500,000	Fri 7/7/00	Thu 6/21/01
29	Commisioning	60 days	$100,000	Fri 6/22/01	Thu 9/13/01
30	LN2 Cryostat Design	7 days	$50,000	Fri 7/7/00	Mon 7/17/00
31	LN2 Cryostat Fabrication	50 days	$100,000	Tue 7/18/00	Mon 9/25/00
32	LN2 Handling	40 days	$20,000	Tue 9/26/00	Mon 11/20/00
33	Move/Refurbish PS	40 days	$40,000	Wed 10/4/00	Tue 11/28/00
34	Move Substation	40 days	$40,000	Wed 11/29/00	Tue 1/23/01
35	Substation Attachment	20 days	$20,000	Wed 1/24/01	Tue 2/20/01
36	Switching System	45 days	$30,000	Wed 2/21/01	Tue 4/24/01
37	Test at AGS, V	40 days	$20,000	Fri 9/14/01	Thu 11/8/01
38	**RF Systems**	**680 days**	**$1,650,000**	**Fri 10/1/99**	**Thu 5/9/02**
39	**RF Cavity**	**680 days**	**$950,000**	**Fri 10/1/99**	**Thu 5/9/02**
40	Design	260 days	$120,000	Fri 10/1/99	Thu 9/28/00
41	Purchase/Fabricate	260 days	$600,000	Fri 9/29/00	Thu 9/27/01
42	Assembly	20 days	$20,000	Fri 9/28/01	Thu 10/25/01
43	Testing w/o beam	60 days	$30,000	Fri 10/26/01	Thu 1/17/02
44	Refurbish/rebuild	20 days	$150,000	Fri 1/18/02	Thu 2/14/02
45	Test at AGS, VI	60 days	$30,000	Fri 2/15/02	Thu 5/9/02
46	**Site Preparation**	**254 days**	**$300,000**	**Tue 8/1/00**	**Fri 7/20/01**
47	Design	30 days	$30,000	Tue 8/1/00	Mon 9/11/00
48	Blockhouse	60 days	$150,000	Tue 9/12/00	Mon 12/4/00
49	Shielding	60 days	$30,000	Tue 12/5/00	Mon 2/26/01
50	Power Service	70 days	$20,000	Wed 2/28/01	Tue 6/5/01
51	Vacuum	120 days	$50,000	Mon 2/5/01	Fri 7/20/01
52	DI Water	45 days	$20,000	Tue 5/1/01	Mon 7/2/01
53	**LBL Transfer**	**50 days**	**$50,000**	**Fri 10/1/99**	**Thu 12/9/99**
54	Testing	40 days	$40,000	Fri 10/1/99	Thu 11/25/99
55	Packing	5 days	$5,000	Fri 11/26/99	Thu 12/2/99
56	Shipping	5 days	$5,000	Fri 12/3/99	Thu 12/9/99
57	**Low Level RF**	**105 days**	**$40,000**	**Wed 4/5/00**	**Tue 8/29/00**
